


## 新庁舎本体工事の進捗について

年度		令和5年度										令和6年度								
年		R5年										R6年								
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
進捗 (%)	予定	0.35%	1.01%	2.06%	3.25%	4.41%	4.85%	11.57%	13.81%	16.18%	24.62%	33.43%	42.54%	54.74%	71.90%	85.16%	91.50%	96.66%	100%	100%
	実施	0.38%	0.65%	2.21%	3.71%	4.41%	4.82%	10.73%	12.23%	14.50%	22.32%	31.13%	37.02%							

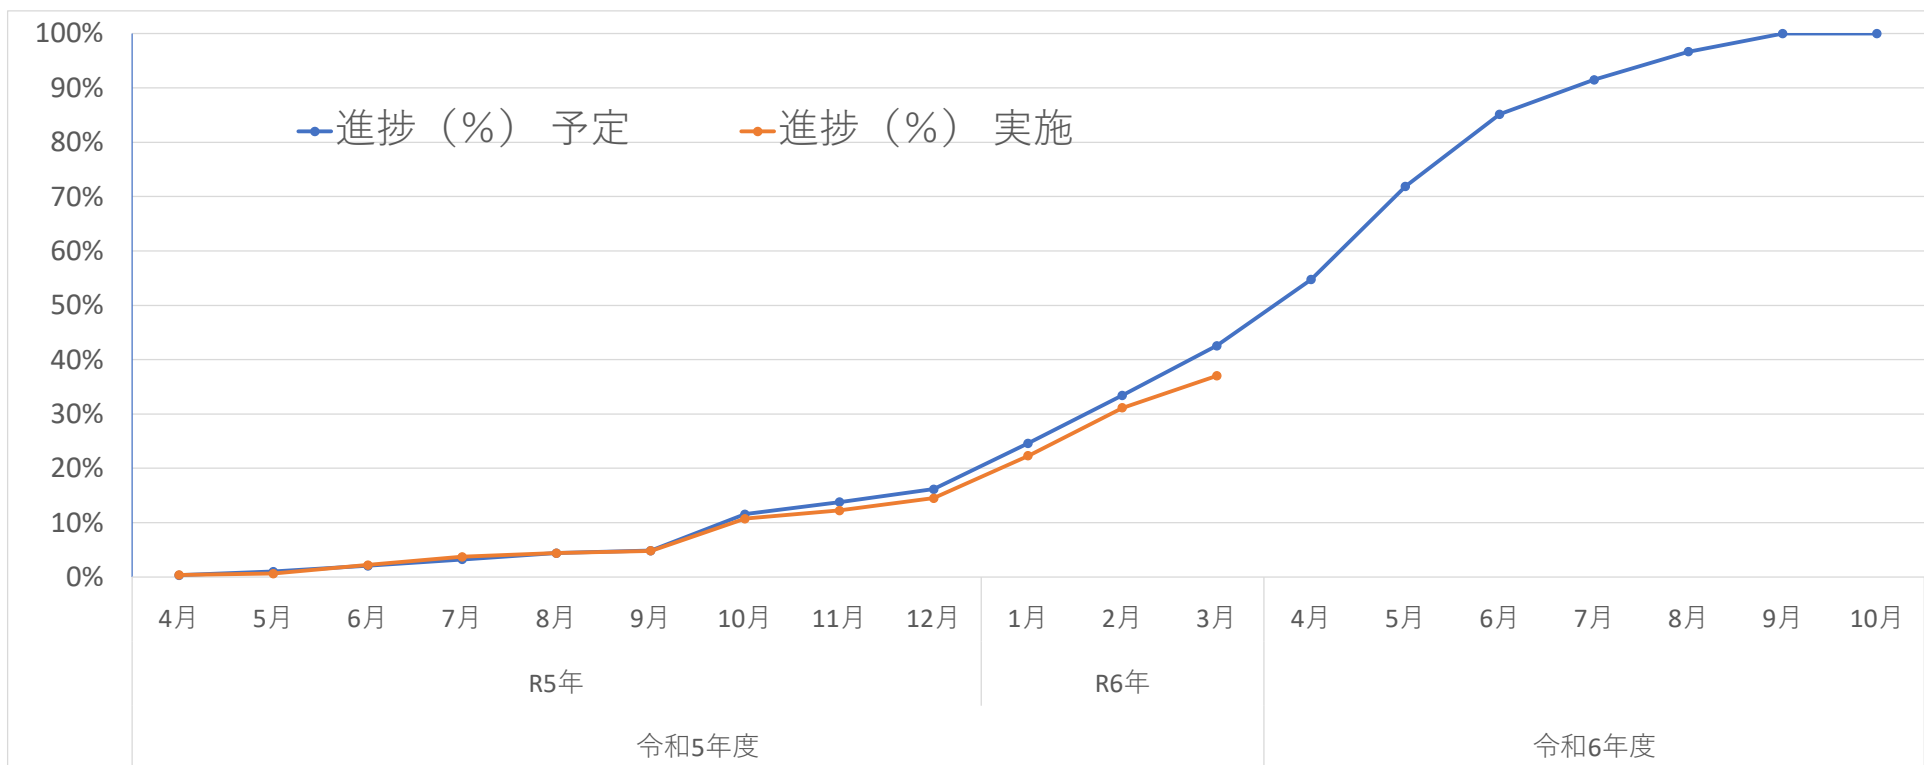

### 主な内容 (開始予定)

令和5年4月頃	外構・造成工事	令和5年10月頃	鉄骨建方	令和6年1月頃	外部足場組立	令和6年4月頃	内装工事
令和5年6月頃	杭工事			令和6年3月頃	屋根工事		
令和5年8月頃	基礎工事				外装工事		
