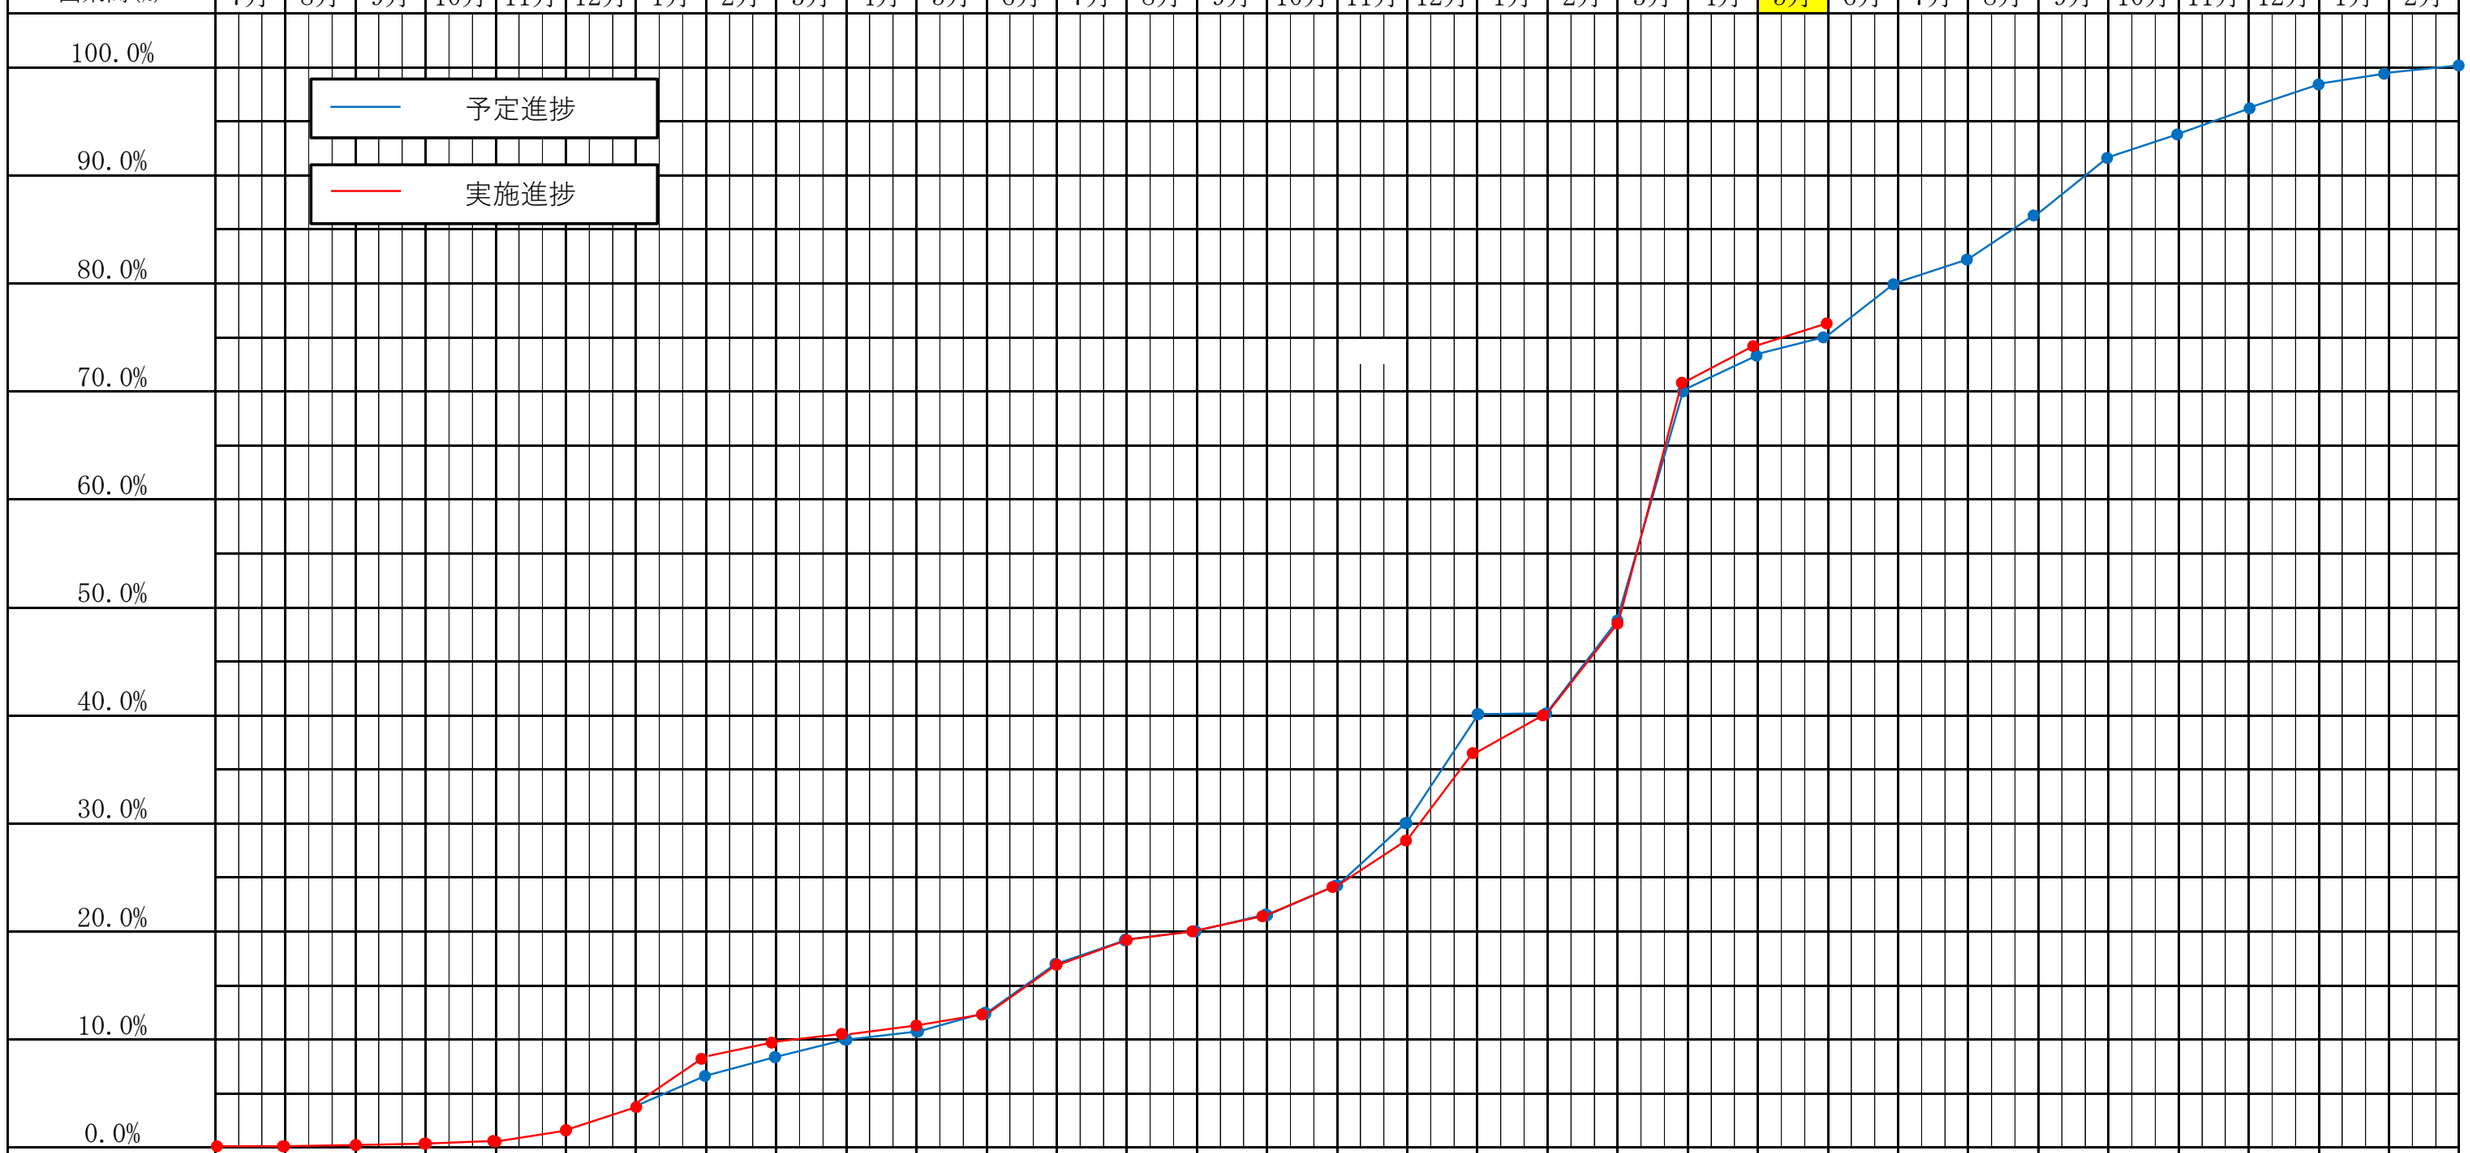工 事 名	佐々町水道事業　浄水場送水ポンプ室築造工事																															
累計月 出来高(%)	令和6年						令和7年												令和8年												令和9年	
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
計画	0.05%	0.15%	0.3%	1.0%	2.0%	4.0%	6.0%	8.0%	10.0%	11.0%	13.0%	17.0%	19.0%	20.0%	22.0%	24.0%	30.0%	40.0%	40.0%	48.0%	70.0%	73.0%	75.0%	80.0%	82.0%	86.0%	92.0%	94.0%	96.0%	98.0%	99.0%	100.0%
実施	0.05%	0.15%	0.3%	1.0%	2.0%	4.0%	8.0%	9.8%	10.3%	11.8%	13.0%	17.0%	19.0%	20.0%	22.0%	24.0%	28.3%	36.5%	40.0%	48.0%	71.5%	74.0%	77.0%
